B E L E G B L A T T

SGD-Nr. Titel: 12304 — RA 01 SEICHTE SONDIERBOHRUNGEN BEIM BAD, SCHINZNACH 02 03

Selektion: 1. 14SCB 2. 3. 4. — Mut. 3

SGD-Nr. 1–7	Anzahl Records (RA) 8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Geologie	10 / 13 / 15	110 67 220	510 57 300									
Km-Netz	18 21	654 256	654 256									
Kartenblatt	24	1069	1069									
Verfügbarkeit	28	-0										

Verfalldatum:

Datum Autor(en) 30 37: 2207980 Autor(en) MØC — Mut. 3

Auftraggeber: Nationaler Energie-Forschungs-Fonds (NEFF), Basel

Dokumentzusammensetzung

Bericht	Notiz	Anzahl Seiten	Graphika, als Beilage oder allein	Tafeln, Abbildungen	Tabelle	Diagramme	Fotografien	Situation 1:5000	geol.Bohrprofilbeschreibungen	Tiefen: 4,1-12,2m	siehe auch SGD 9'900'018									
			2					1	11											


Originalkennzeichen des Dokumentes: 14.0518.01.046 und 047

(Beilagen 4.1/1 und 4.1/2


Geograph.Lage: (Koordinaten) Schwerpunkt ca. 654'65/256'65 (oder Gebiet)*

Standort: SGD

EB



BOHRPLAN SCHINZNACH

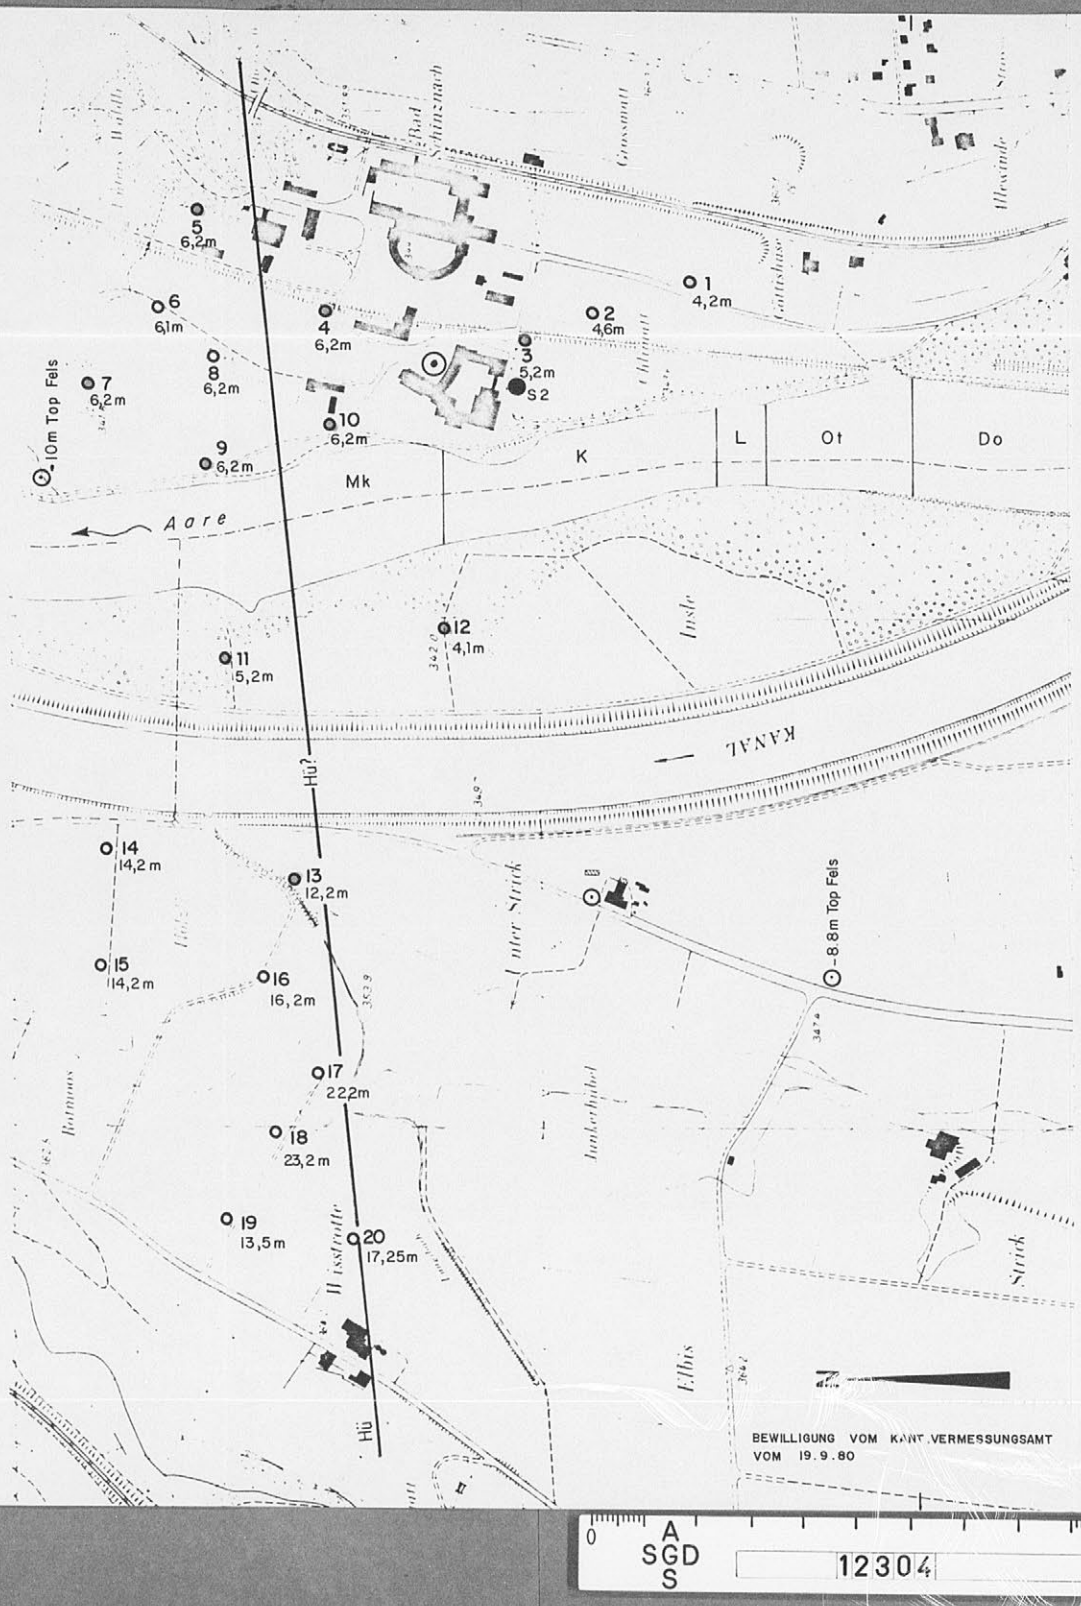

LEGENDE :

o 10 6,2 m	SEICHTES BOHRLOCH MIT NUMMER UND TIEFE
● S2	MITTELTIEFE BOHRUNG , 135 m
⊙	THERMALQUELLE
⊙ -8,8m	EXISTIERENDE BOHRUNGEN MIT FELSKOTE
Hü	HAUPTÜBERSCHIEBUNG
Mk	MUSCHELKALK
K	KEUPER
L	LIAS
Ot	OPALINUSTON
Do	OB. DOGGER

BESCHREIBUNG DES BOHRGUTES SIEHE BEILAGE 4.1/1

0 100 200 300 m

1 : 5000

BEWILLIGUNG VOM KANT. VERMESSUNGSAMT VOM 19.9.80

DAT: 12.12.79	VIS:	NR.: 14.0518.01.047	MOTOR COLUMBUS

0 A SGD S 10
12304

SEICHTE BOHRUNGEN SCHINZNACH

Beschreibung des Bohrgutes von
Herrn Weber, Bohrmeister der Firma Stump AG

(GWSp in m unter OK-Terrain, Okt./Nov. 1979)

SS 1
0 - 1,2 m Humus
1,2 - 3,5 m Aareschotter
ab 3,5 m Fels (Mergel)
Bohrende 4,2 m
GWSp ~ 2,5 m

SS 2
0 - 0,8 m Humus
0,8 - 1,3 m Sand und Silt
1,3 - 4,3 m Schotter
ab 4,3 m Fels (rote Tone)
Endtiefe 4,6 m
GWSp ~ 1,7 m

SS 3
0 - 0,2 m Humus
0,2 - 1,3 m Silt
1,3 - 5,2 m Schotter
Bohrende 5,2 m
GWSp ~ 1,5 m

SS 4
0 - 0,3 m Humus
0,3 - 1,6 m Silt
1,6 - 6,2 m Schotter
Bohrende 6,2 m
GWSp ~ 2,8 m

SS 5
0 - 0,3 m Humus
0,3 - 2,3 m Silt und Sand
2,3 - 6,2 m Kies
Bohrende 6,2 m
GWSp ~ 3,2 m

SS 6
keine Angaben über Bohrgut
Bohrende 6,2 m
GWSp ~ 3,2 m

SS 7
0 - 0,2 m Humus
0,2 - 1,3 m Silt und Steine
1,3 - 6,2 m Kies, sandig
Bohrende 6,2 m
GWSp ~ 3,1 m

SS 8
keine Angaben über Bohrgut
Bohrende 6,2 m
GWSp ~ 2,9 m

SS 9
0 - 1,6 m Silt mit vereinzelten Blöcken
1,6 - 6,2 m Kies, sandig
Bohrende 6,2 m
GWSp ~ 3,15 m

SS 10
0 - 0,2 m Humus
0,2 - 1,6 m Silt, Sand
1,6 - 6,2 m Kies, vereinzelte Steine
Bohrende 6,2 m
GWSp ~ 2,9 m

0 A SGD S 10 12304
